

街づくりにむけて

全体スケジュール	
平成16年度まで	平成 4年 9月16日 5年 3月30日 6年 9月21日 7年12月 6日 8年 6月 5日 8年12月20日 8年12月20日 9年 6月17日 10年 7月31日 11年10月 1日 12年12月 6日 13年 6月15日 14年 9月 3日
	■ 都市計画決定 ■ 施行条例の制定 ■ 事業計画決定 ■ 土地区画整理審議会委員の選出（10名） ■ 土地区画整理評価員の任命（4名） ■ 土地評価基準の施行 ■ 換地設計基準の施行 ■ 事業計画変更決定（第1回） ■ 仮換地指定 ■ 地区計画の都市計画決定 ■ 土地区画整理審議会委員の改選（10名） ■ 事業計画変更決定（第2回） ■ 事業計画変更決定（第3回）
平成17年度	■ 移転物件の調査 ■ 補償・移転の実施、公共施設及び宅地の整備 ■ 海老洗橋の完成 ■ 土地区画整理審議会委員の改選（10名）
平成18年度以降	■ 移転物件の調査 ■ 補償・移転の実施、公共施設及び宅地の整備

◆このニュースはみなさんと街づくりを検討する資料です。大切に保管してください。◆

●お問い合わせ・ご意見は下記まで●
市街地整備事務所
TEL(0569)22-9302 / FAX(0569)22-8561
半田市建設部市街地整備課
E-mail : shigai@city.handa.lg.jp
URL : <http://www.city.handa.aichi.jp/shigai/>


Okkawa Chubu
Town Planning

乙川中部

自然が生きる住みたくなる街

街づくり

こんな街になります

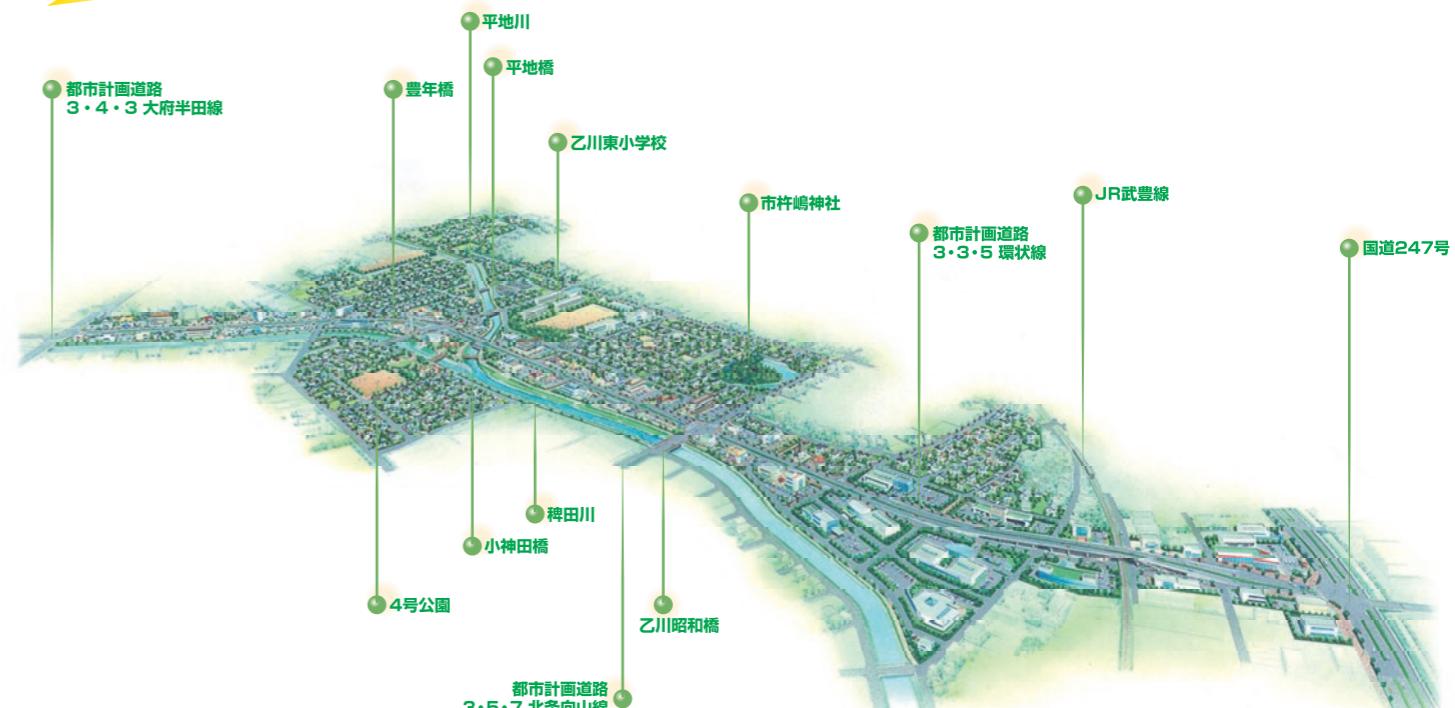

平成17年9月
(1988.1.No.1発刊)

半田市

これまでの整備状況について

半田乙川中部土地区画整理事業の整備状況としては、平成17年3月末で建物移転が約33%、事業費では約27%という進捗率となっています。

平成10年7月に仮換地の指定をさせて頂き、物件移転補償などを中心に進めてまいりましたが、平成12年に大きな被害をもたらした東海豪雨を教訓として、昨年度までは河川の改修と雨水管整備を当該地区の重点課題として取り組んでまいりました。

平地川の改修工事については、平成11年に着手、平成15年度に完了しており、現在は稗田川の改修工事を進めているところです。

また雨水管整備については、平成14年度から乙川東・平地・大池排水区の工事に着手していますが、平地排水区は平成16年に完了済みで、大池排水区は平成17年度完了予定、乙川東排水区も残りわずかとなっています。



これからのおおむね整備予定について

平成17年度は、海老洗橋の築造工事、乙川東・大池排水区の雨水管整備工事、稗田川の改修工事を行うとともに、建物移転とそれに伴う道路整備、宅地造成工事などを行ってまいります。

また、当該地区的皆さんの利便性を高めるため、環状線を暫定的に通行できるよう整備する予定をしています。

工事中は通行規制など、いろいろとご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

